

Programme MAGDELESA
Pose DCPDOM2

Rapport d'opération.

<i>Destinataires :</i>	2
<i>Date de la mission :</i>	2
<i>Objectifs de l'opération :</i>	2
<i>Moyens utilisés :</i>	2
<i>Documents présents à bord :</i>	2
<i>Conditions météorologiques :</i>	2
<i>Rapport journalier :</i>	3
<i>Résumé et bilan de l'opération :</i>	4
<i>Annexes et photos</i>	5
<i>Carte 1 : trajet du 17 décembre 2011</i>	5
<i>Photo1 : DCPDOM2, signalétique</i>	6
<i>Photo2 : DCPDOM2, signalétique</i>	7
<i>Photo3 : DCPDOM2, mise à l'eau du chapelet</i>	8
<i>Photo4 : DCPDOM2</i>	9
<i>Photo5 : DCPDOM2</i>	10
<i>Photo6 : DCPDOM2 et canot Emmanuel 2</i>	11

Destinataires :

Lionel REYNAL Chef de mission programme MAGDELESA, IFREMER
Julian DEFOE, Fisheries Officer, Fisheries Division Dominica

Date de la mission :

Le 17 décembre 2011

Objectifs de l'opération :

Pose DCPDOM2 à l'ouest de la Dominique

Moyens utilisés :

Navire BERYX et ses appareils

Documents présents à bord :

1. Permis de navigation en cours de validité
2. Tous autres documents réglementaires pour ce type de navire dans sa catégorie de navigation.

Conditions météorologiques :

Sur l'ensemble de la période : vent de secteur Nord-est modéré, mer peu agitée, houle de Nord, très bonne visibilité.

Rapport journalier :

Le 16 décembre 2011

Présents à bord :

Équipage :

Paul GERVAIN (patron)

Yann GERVAIN

08 :30 Quitté la marina de Rivière-Sens.

08 :35 En route, destination site de pose de DCPDOM2.

12 :20 Arrivé sur site début des opérations de pose.

12 :52 Largage du bloc béton, position : 15°26.012 N 061°46.064 W, profondeur 2010 m.

13 :01 Arrivé sur zone du canot dominiquais Emmanuel 2.

13 :17 Fin des opérations.

13 :19 En route, destination Rivière-Sens

16 :50 A quai à Rivière-Sens.

PLKMarine
Allée des cocotiers
97120 Saint-Claude
Siret 509 045 753 00019


Résumé et bilan de l'opération :

Le DCP DCPDOM2 est posé.
Position largage : 15°26.012 N 061°46.064 W.
Profondeur 2010 m.
Longueur totale de ligne d'ancrage 2500 m :
Mixte diam 14 : 300 m
PP14 : 100 m
PP14 plombé : 200 m
PP14 : 1900 m

Rapport établi par Paul GERVAIN patron du BERYX
Gérant de PLKMarine
Le 18 Décembre 2011

A handwritten signature in blue ink, reading "Pgermain", with a horizontal line drawn underneath the name.

Annexes et photos

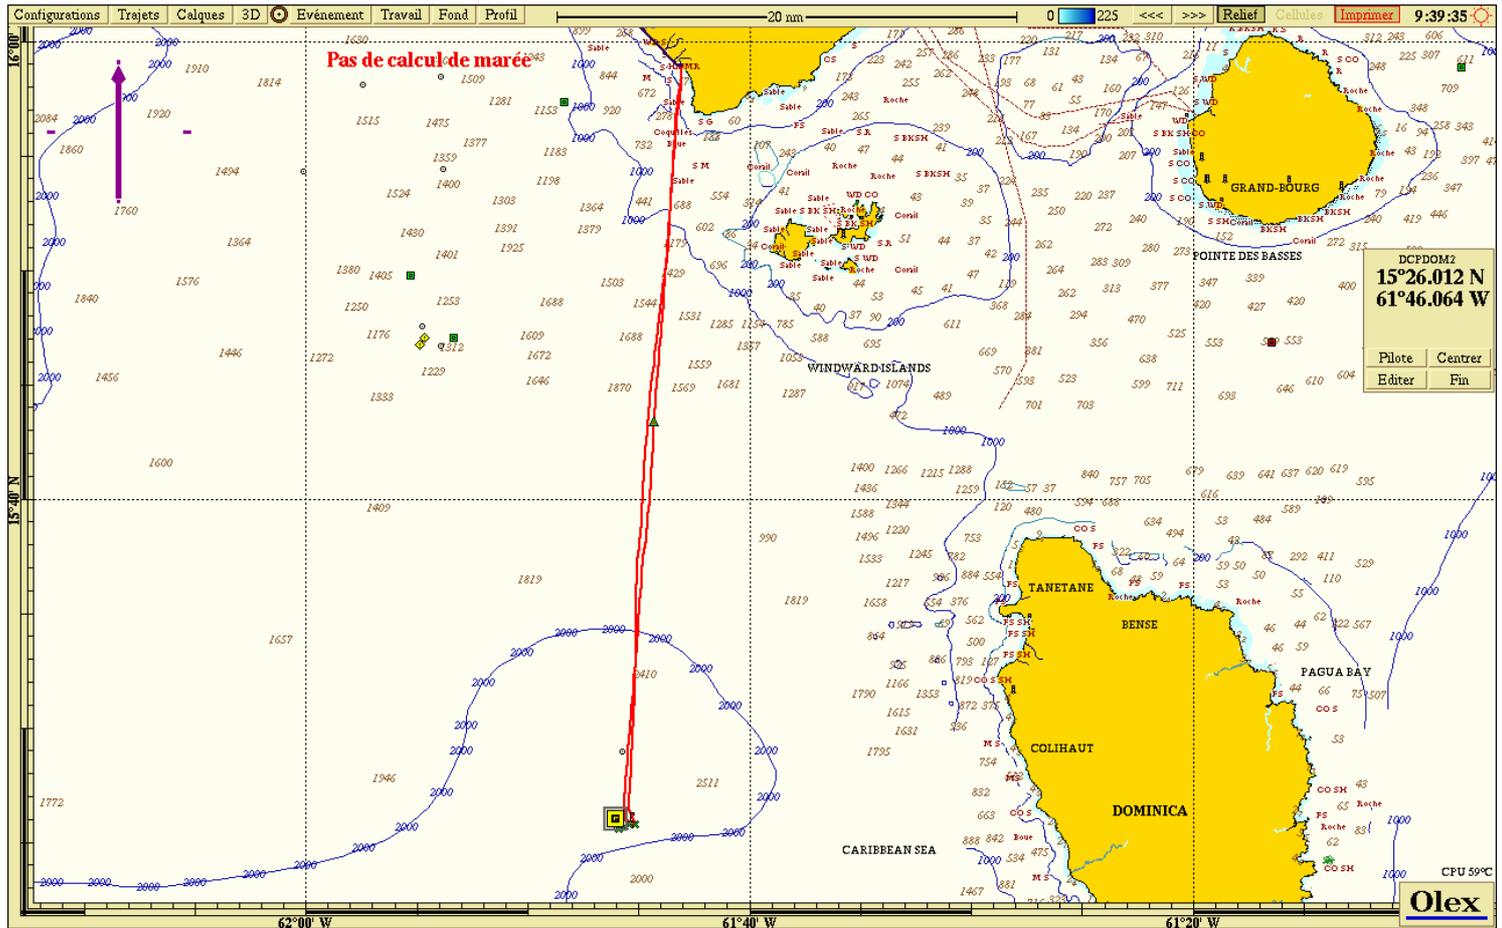

Carte 1 : trajet du 17 décembre 2011



Photo1 : DCPDOM2, signalétique



Photo2 : DCPDOM2, signalétique



Photo3 : DCPDOM2, mise à l'eau du chapelet



Photo4 : DCPDOM2



Photo5 : DCPDOM2



Photo6 : DCPDOM2 et canot Emmanuel 2
